Carta Nº407/ GP-FE-2015

Lima, 02 de junio de 2015

Señor
PABLO QUIÑONES ASENCIOS
Director Ejecutivo
Caritas Huari
Jr. Ancash 920 - Huari
Ancash – Perú
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-11-01 "Incremento del ingreso y el empleo mediante el cultivo de la tara en la microcuenca de Yanamayo"

De mi mayor consideración:

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº A. Martinez

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-11-01 "Incremento del ingreso y el empleo mediante el cultivo de la tara en la microcuenca de Yanamayo" ejecutado por Caritas Huari, cuya fecha de inicio fue el 01 de abril de 2012 y la fecha de término el 30 de marzo de 2015.

Sin otro particular,

Atentamente,

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº H. Meza

Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AEFM/aema
Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-11-01
Cc: - Planeamiento y evaluación
- Auditoría y control

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE

PROYECTO:

"Incremento del ingreso y el empleo mediante el cultivo de la tara en la microcuenca de Yanamayo"

CÓDIGO: C – 11 - 01

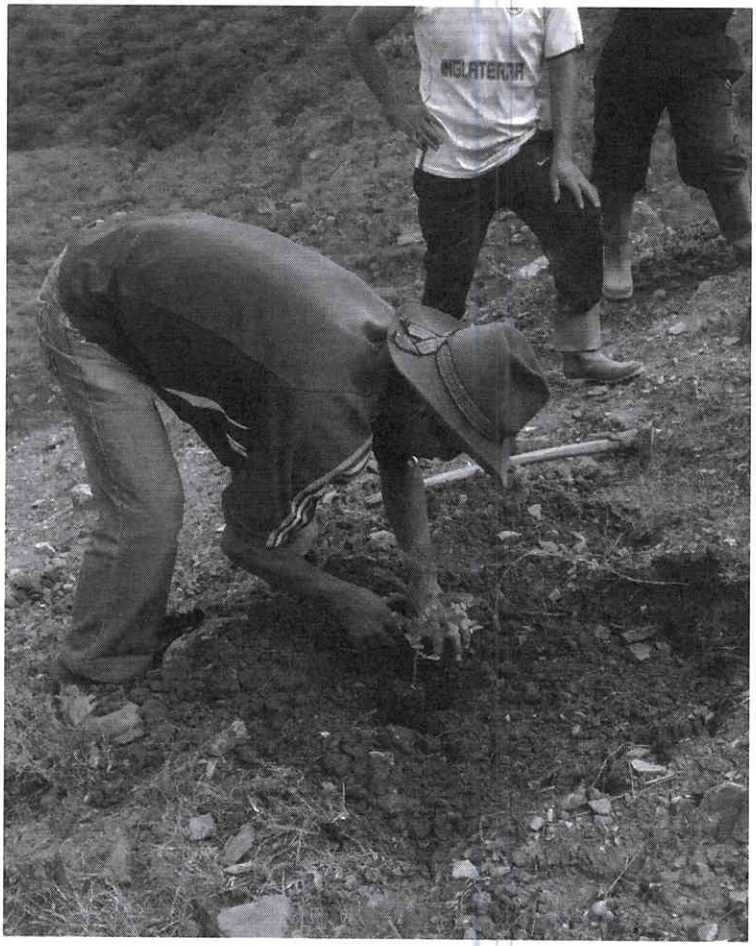

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº A. Martínez

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº H. Meza

GERENCIA DE PROYECTOS VºBº A. Fort

Mayo, 2015

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

1. ASPECTOS TÉCNICOS

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-11-01	**Concurso:**	11	**Fecha:**	8 abr 2015
Título del proyecto:	Incremento del ingreso y el empleo mediante el cultivo de la tara en la microcuenca de Yanamayo				
Ubicación:	**Departamento**	Áncash	**Provincia (s)**	Carlos Fermín Fitzcarrald, Yungay, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba	
	Distrito(s)	San Luis, San Nicolás, Yauya, Piscobamba, Llama, Llumpa, Musga, Huayllán y Yanama			
Institución Ejecutora:	Asociación Cáritas Huari				
Población Objetivo	560 productores de tara de 24 comunidades rurales de los distritos de San Luis, San Nicolás, Yauya, Piscobamba, Llama, Llumpa, Musga, Huayllán y Yanama, ubicados en la microcuenca del Yanamayo.				
Propósito (Objetivo Central)	Productores capacitados mejoran niveles de productividad de la tara en 24 comunidades de los distritos de San Luis, San Nicolás, Yauya, Piscobamba, Llama, Llumpa, Musga, Huayllán y Yanama.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Alfredo Gaviria Guedes		**Cargo**	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	Aldo Martínez Alca		**Cargo**	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	01/04/12		**Fecha de término**	30/03/2015	
Ampliación:	---		**Duración:**	36 meses	

1.2. ANTECEDENTES

En el año 2008 el Perú se consolidó a nivel mundial como uno de los principales países abastecedores de productos para teñir o curtir al mantener una participación promedio de 28% (www.trademap.org). La producción y manejo racional de bosques de tara se presentaba como una gran alternativa y oportunidad de desarrollo para las familias de agricultores, tanto en el aspecto económico como en el ambiental. La venta de tara alcanzó los US$ 43.23 millones en el año 2010[1].

La microcuenca del río Yanamayo se encuentra enclavada entre los 1,850 y 2,900 m.s.n.m. y forma parte de las cabeceras del río Marañón en la región Ancash. Es una zona netamente agrícola con bosques naturales de tara, que no se estaban aprovechando adecuadamente, sino que por el contrario se estaba depredando sin contribuir significativamente a mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales.

En el proceso de formulación de la propuesta, se diagnosticó que la baja producción y productividad en el cultivo de tara se debía principalmente a la carencia de asistencia

[1] PROMPERU: Resumen de exportaciones 2010, Junio 2,011.

técnica reflejada en plantas con bajos índices de rendimiento, parasitadas, con incidencia de plagas y enfermedades, sin aplicación de riegos ni abonamientos y sin mayores conocimientos sobre el mercado y los sistemas adecuados de comercialización.

Otra de las debilidades identificadas fue la desorganización de los agricultores locales para la producción y la comercialización. La desordenada participación de agentes que intervienen en los canales de comercialización y la presencia de intermediarios o acopiadores que reducen los márgenes de ganancia de los productores también fueron identificadas como amenazas.

En este marco se propuso un proyecto que aproveche las ventajas competitivas de la zona para el cultivo de tara (condiciones de suelo, clima, adaptabilidad, alto contenido de tanino) y que permita generar empleos dignos y mejorar los ingresos familiares; el proyecto buscó superar la falta de apoyo gubernamental y privado para favorecer la agricultura de la zona, donde la mayoría de la población se encuentra en extrema pobreza.

El proyecto se enmarca en las líneas establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021 de la Región Ancash, que establece como política dentro del eje económico la mejora de las actividades agropecuarias, forestales e hidrobiológicos, promoviendo el desarrollo de capacidades, la investigación y la recuperación de productos forestales poniendo énfasis en la puesta en marcha de un programa regional de reforestación.

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

1.3. SÍNTESIS DEL PROYECTO

El fin del proyecto es contribuir a mejorar el nivel de empleo e ingresos familiares de los productores de tara de la microcuenca del río Yanamayo en la región Áncash.

3.1. Indicadores de propósito

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

- ✓ 600 productores de tara han sido capacitados durante la ejecución del proyecto.
- ✓ 66,493 jornales (246 puestos de trabajo equivalentes) han sido generados durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Incremento de ingresos brutos por venta de tara de S/.972,000.00 sin proyecto a S/.1'967,200.00, durante la ejecución del proyecto, es decir S/.995,200 (102%)
- ✓ Incremento de productividad de 4 a 6 kg/planta en el primer año, de 6 a 9 kg/planta en el segundo año y de 9 a 12 kg/planta en el tercer en 32,400 plantas, es decir de 8 kg/planta (200%)

GERENCIA DE PROYECTOS V°B° A. Fort

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01:

- ✓ 129.60 ha de bosque natural de tara (32,400 plantas) son limpiadas, abonadas, regadas, podadas, raleadas y reciben control fitosanitario, en los 03 años de ejecución del proyecto
- ✓ 192 ha de plantaciones en macizo son abonadas, regadas, podadas y reciben control fitosanitario en los 02 últimos años de ejecución del proyecto.

- ✓ 400 ha de plantaciones en agroforesteria son abonadas, regadas, podadas y reciben control fitosanitario en los 02 últimos años de ejecución del proyecto.

Componente 02:

- ✓ Producción en 2 campañas de 220,000 plantones de tara, a razón de 110,000 por año, producidos en los 4 viveros, en el periodo de mayo–oct en los 2 primeros años.
- ✓ 192 ha de plantaciones establecidas en macizo, 96 ha en el 1º año y 96 has en el 2º año, a razón de 625 plantas/ha, en el periodo oct-feb durante los 2 primeros años.
- ✓ 400 ha de plantaciones establecidas en agroforestería, 200 ha en el 1º año y 200 ha en el 2º año a razón de 200 plantas/ha, en el periodo oct-feb en los 2 primeros años.

Componente 03:

- ✓ 24 comités de productores organizados (1 por comunidad) promueven la producción y comercialización de tara.
- ✓ 600 productores de tara capacitados en temas de organización y gestión comercial.
- ✓ Formación y capacitación de 48 promotores comunales, 2 por cada comunidad.
- ✓ Suscripción de 6 convenios de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de vainas de tara
- ✓ Incremento de 388.80tn a 786.88tn de producción y comercialización de vainas de tara (155.52tn el 1º año, 220.32tn el 2º año y 411.04tn el 3º año), es decir 398.08tn equivalente a 102% durante los 3 años de ejecución del proyecto.

1.4. LOGROS DEL PROYECTO

1.4.1. Indicadores de propósito

Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
600 productores de tara han sido capacitados durante la ejecución del proyecto.	655 productores	100.00	655 productores fueron capacitados en establecimiento de plantaciones de tara
66,493 jornales (246 puestos de trabajo equivalentes) han sido generados durante la ejecución del proyecto.	68,387 jornales (253.29 puestos de trabajo equivalentes)	100.00	36,590 jornales (54%) en manejo de tara 19,397 jornales (28%) en plantaciones 12,400 jornales (18%) en comercialización
Incremento de ingresos brutos por venta de tara de S/.972,000.00 sin proyecto a S/.1'967,200.00 durante la ejecución del proyecto, es decir **S/.995,200** (102%)	684,901	34.81	Ventas por S/ 341,852 en año 0 Ventas por S/ 258,393 en año 1 Ventas por S/ 508,817 en año 2 Ventas por S/ 684,901 en año 3 Se sobreestimó la producción y precio de venta inicial en el diseño del proyecto
Incremento de productividad de 4 a 6 kg/planta en el primer año, de 6 a 9 kg/planta en el segundo año y de 9 a 12 kg/planta en el tercer año en 32,400 plantas, es decir **8 kg/planta** (200%)	5.54 kg/planta	46.16	Productividad año 0: 1.42 kg/planta Productividad año 1: 1.40 kg/planta Productividad año 2: 3.86 kg/planta Productividad año 3: 5.54 kg/planta Se sobrestimó la producción y precio de venta en el diseño del proyecto

1.4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de ejecución	Comentarios
Componente 1 Productores de tara capacitados realizan manejo adecuado de plantas silvestres y nuevas plantaciones de tara	**Indicador 1.1.** 129.60 ha de bosque natural de tara (32,400 plantas) son limpiadas, abonadas, regadas, podadas, raleadas y reciben control fitosanitario, en los 3 años de ejecución del proyecto	129.60	124.30	95.91	Poda, raleo y limpieza: 31,034 plantas año 1, 40,654 año 2 y 51,661 año 3. Remoción y abonamiento: 17,742 plantas año 1, 22,189 año 2 y **31,076** año 3. Control fitosanitario: 24,533 plantas año 1, 34,804 plantas año 2 y 37,796 plantas año 3.
	Indicador 1.2. 192 ha de plantaciones en macizo son abonadas, regadas, podadas y reciben control fitosanitario en los 2 últimos años de ejecución del proyecto.	192	306.92	100.00	Año 2: 132.74 ha Año 3: 306.92 ha (132.74 + 124.76 + 49.42)
	Indicador 1.3. 400 ha de plantaciones en agroforestería son abonadas, regadas, podadas y reciben control fitosanitario en los 2 últimos años de ejecución del proyecto.	400	108.43	27.11	Año 2: 52.27 ha Año 3: 108.43 ha (52.27 + 54.97 + 1.19)
Componente 2 Productores de tara capacitados establecen nuevas plantaciones de tara en macizos y agroforestería	**Indicador 2.1**. Producción en 2 campañas de 220,000 plantones de tara, a razón de 110,000 por año, producidos en los 4 viveros, en el periodo de mayo–oct en los 2 primeros años.	220,000	226,618	100.00	Año 1: 93,419 plantones sembrados Año 2: 88,971 plantones sembrados Año 3: 44,228 plantones sembrados
	Indicador 2.2. 192 ha de plantaciones establecidas en macizo, 96 ha en el 1º año y 96 has en el 2º año, a razón de 625 plantas/ha, en el periodo oct-feb durante los 2 primeros años.	192	306.92	100.00	Año 1: 82,965 plantas (132.74 ha) Año 2: 77,977 plantas (124.76 ha) Año 3: 30,890 plantas (49.42 ha)
	Indicador 2.3. 400 ha de plantaciones establecidas en agroforestería, 200 ha en el 1º año y 200 ha en el 2º año a razón de 200 plantas/ha, en el periodo oct-feb en los 2 primeros años.	400	108.43	27.11	Año 1: 10,454 plantas (52.27 ha) Año 2: 10,994 plantas (54.97 ha) Año 3: 238 plantas (1.19 ha)
Componente 3 Productores capacitados y organizados se fortalecen en la articulación comercial de productores de tara	**Indicador 3.1.** 24 comités de productores organizados (1 por comunidad) promueven la producción y comercialización de tara.	24	22	91.67	Se retiraron las comunidades Gajanga y Uchupampa, del distrito Llumpa.
	Indicador 3.2. 600 productores de tara capacitados en temas de organización y gestión comercial.	600	107	17.83	Es la mayor debilidad del proyecto.
	Indicador 3.3. Formación y capacitación de 48 promotores comunales, 2 por cada comunidad.	48	44	91.67	Debido al retiro de las comunidades Gajanga y Uchupampa.
	Indicador 3.4. Suscripción de 6 convenios de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de vainas de tara	6	2	33.33	La mayor debilidad del proyecto se refiere a la comercialización de vainas.
	Indicador 3.5. Incremento de 388.80 t a 786.88 t de producción y comercialización de vainas de tara (155.52 t el 1º año, 220.32 t el 2º año y 411.04 t el 3º año), es decir 398.08 t equivalente a 102% durante los 3 años de ejecución del proyecto.	786.88	306.68	38.97	Cosecha año 0: 136.046 t Cosecha año 1: 98.872 t Cosecha año 2: 218.316 t Cosecha año 3: 306.680 t

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº H. Meza

GERENCIA DE PROYECTOS VºBº A. Fort

1.4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Producto	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
1. Productores de tara capacitados realizan manejo adecuado de plantas silvestres y nuevas plantaciones de tara	**1.2** 381.08 ha (32,400 plantas) de tara silvestre son podadas, raleadas y limpiadas de plantas parasitarias (A1: 121.88 ha, A2: 129.6 ha, A3: 129.6 ha)	381.08	345.51	90.67	La técnicas de limpieza y poda han sido las más aceptadas por los productores, no así el raleo.
	1.3 294.54 ha (32,400 plantas) de tara silvestre son removidas y abonadas	294.54	249.37	84.66	La remoción y el abonamiento se realizaron en paralelo.
	1.4 339.09 ha (32,400 plantas) de tara silvestre reciben control fitosanitario	339.09	268.46	79.17	Se usó azufre agrícola, sulfato de cobre, aceite agrícola y un insecticida
	1.5 293.10 ha (183,188 plantas) de nuevas plantaciones de tara en macizo reciben podas de formación, abonamiento y control fitosanitario	293.10	196.46	67.03	El abonamiento ha sido la práctica más adoptada por los productores. La menos practicada ha sido el control fitosanitario.
	1.6 84.06 ha (16,812 plantas) de nuevas plantaciones de tara en sistemas agroforestales reciben podas de formación, abonamiento y control fitosanitario	84.06	81.42	96.86	
	1.7 600 productores capacitados aplican técnicas de manejo silvicultural de tara (podas y raleo, abonamiento, control fitosanitario, manejo de plantaciones nuevas en macizo y agroforestería.	600	409	68.17	409 productores llegaron a aplicar técnicas de control sanitario.
2. Productores de tara capacitados establecen nuevas plantaciones de tara en macizos y agroforestería	**2.2** 6 viveros acondicionados e implementados logran 2 campañas de producción de plantones de tara de 25 a 30 cm de altura.	6	6	100.00	Se produjeron en tres campañas.
	2.3 Producción de 220,000 plantones de tara (incluye 10% de mortandad).	220,000	226,618	100.00	Se logró superar la meta inicialmente planteada
	2.4 293.10 ha de plantaciones de tara en macizo establecidas con 625 pl/ha	293.1	196.46	67.03	Inicialmente se programaron 192 ha.
	2.5 84.06 ha de plantaciones agroforet son establecidas con 200 plant/ha.	84.06	53.66	63.84	No se logró la meta por la poca disponibilidad de parcelas
	2.6 560 personas capacitadas en viveros, producción y establecimiento de plantaciones de tara aplican lo impartido	560	446	79.64	Son 446 beneficiarios que aplican lo aprendido.
	2.7 Recalce de 12.95 millares de plantones en macizo y agroforestería	12.95	13.1	100.00	Se logró superar la meta planteada.
3. Productores capacitados y organizados se fortalecen en la articulación comercial de productores de tara	**3.1** 786.88 t de vainas de tara comercializados	786.88	620.21	78.82	Año 1: 98.87 t Año 2: 218.32 t Año 3: 303.02 t
	3.3 560 personas capacitadas en organización y gestión empresarial aplican lo impartido.	560	107	19.11	Los productores no han llegado a comercializar en forma organizada.
	3.4 Formación y capacitación de 48 promotores comunales de las 24 comunidades	48	44	91.67	Se retiraron las comunidades Gajanga y Uchupampa, del distrito Llumpa
				79.11	

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

GERENCIA DE PROYECTOS V°B° A. Fort

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
	producción y establecmiento de plantaciones de tara.					
	2.2.3 Elaboración de trípticos	Tríptico	1	1	100.00	Se verificó la existencia de los trípticos.
	2.2.4 Instalación y manejo de parcelas demostrativas de plantación	Parcela demostrativa	22	22	100.00	Meta reprogramada de 24 a 22
Actividad 2.3	2.3.1 Construcción de vivero	Vivero	4	4	100.00	Se construyeron 2 viveros y se acondicionaron 2
	2.3.2 Acondicionamiento e implementación de viveros	Vivero	10	10	100.00	Se cumplió de acuerdo a lo programado
Actividad 2.4	2.4.1 Producción de plantones de tara	Campaña	3	3	100.00	Meta reprogramada de 2 a 3
Actividad 2.5	2.5.1 Plantación de tara en macizo	Hectárea	293.1	196.46	67.03	Los beneficiarios aportaron con guano de corral, postes de madera para la instalación de cercos y mano de obra.
	2.5.2 Plantaciones de tara en agroforestería	Hectárea	84.06	81.42	94.86	
	2.5.3 Apoyo a la conducción de agua entubada para riego	Metro	7,750	10,350	100.00	Ha tenido gran aceptación entre los productores y han mejorado y ampliado el sistema implementado.
	2.5.4 Apoyo a la conducción de agua con manguera	Metro	7,200	8,700	100.00	Algunos productores adquirieron más manguera y mejoraron el sistema de riego implementado.
	2.5.5 Recalce de plantaciones	Millar	12.95	13.10	100.00	Se logró superar la meta porque se planificó una mayor producción
Componente 3 Productores capacitados y organizados se fortalecen en la articulación comercial de productores de tara						
Actividad 3.1	3.1.1 Asistencia técnica y seguimiento en comercialización	Asistencia técnica en comercialización	3,765	3,412	90.62	Meta reprogramada: 4,320
Actividad 3.2	3.2.1 Comités de productores organizados	Comité de productores	24	22	91.67	Por retiro de la comunidad Gajanga y de Uchupampa.
	3.2.2 Gestión de los comités de productores	Gestión de comité	24	22	91.67	Por retiro de la comunidad Gajanga y de Uchupampa.
Actividad 3.3	3.3.1 Capacitación en comercialización y gestión empresarial	Curso (comercialización)	26	26	100.00	Meta reprogramada de 20 a 26
	3.3.2 Elaboración de manual en organización, comercialización y gestión empresarial	Manual (comercialización)	1	1	100.00	Se verificó la existencia del manual.
	3.3.3 Elaboración de trípticos	Tríptico comercial	1	1	100.00	Se verificó la existencia.
Actividad 3.4	3.4.1 Capacitación y formación de promotores comunales	Curso-taller para promotores	10	11	100.00	Los promotores cuentan con los mejores campos de tara.
	3.4.2 Pasantía de promotores y líderes comunales	Pasantía de promotores y líderes	3	3	100.00	Se realizó dos pasantías en el año 2 y uno en el año 3 a la región Ayacucho.
Actividad 3.5	3.5.1 Participación en eventos de promoción	Evento	3	3	100.00	A nivel local y regional.
	3.5.2 Suscripción de convenios de colaboración mutua	Convenio de colaboración	2	2	100.00	Meta reprogramada de 6 a 2
	3.5.3 Comercialización de vainas de tara	Tonelada	786.88	620.21	78.87	98.87 t, 218.32 t y 303.02 t en el 1°, 2° y 3° año respectivamente
					96.13	

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

GERENCIA DE PROYECTOS V°B° A. Fort

1.4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzadas al finalizar el proyecto

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
Componente 1 Productores de tara capacitados realizan manejo adecuado de plantas silvestres y nuevas plantaciones de tara						
Actividad 1.1	1.1.1 Presentación del proyecto	Reunión	10	10	100.00	Meta reprogramada de 8 a 10
	1.1.2 Identificación y selección de productores	Ficha	614	614	100.00	Se logró cumplir la meta en el primer año de ejecución.
Actividad 1.2	1.2.1 Asistencia técnica y seguimiento en manejo silvicultural de tara	Asistencia técnica en manejo silvicultural	8,389	8,033	95.76	Meta reprogramada de 12,960 a 8,389
	1.2.2 Elaboración de plan general de manejo forestal de tara de la comunidad de Huaychó	Plan de manejo de tara de Huaychó	1	1	100.00	Incorporado en el POA del año 2
Actividad 1.3	1.3.1 Capacitación a productores en manejo silvicultural de tara	Curso	25	25	100.00	Meta reprogramada de 20 a 25
	1.3.2 Elaboración de manual de manejo silvicultural de tara	Manual	1	1	100.00	Se distribuyó a los beneficiarios del proyecto
	1.3.3 Elaboración de afiches	Afiche	1	1	100.00	Se distribuyó a beneficiarios y al público en general
	1.3.4 Elaboración de trípticos	Tríptico	1	1	100.00	Se distribuyó a beneficiarios y al público en general
	1.3.5 Instalación y manejo de parcelas demostrativas	Parcela demostrativa	22	22	100.00	Meta reprogramada de 24 a 22
Actividad 1.4	1.4.1 Realización de limpieza, poda, y raleo en plantas silvestres de tara	Hectárea	410.72	345.51	84.12	Se dejó plantas con un distanciamiento adecuado entre 3 y 4 metros.
	1.4.2 Remoción y abonamiento de plantas silvestres de tara	Hectárea	271.33	249.37	91.91	Actividad importante para el desarrollo de la planta
	1.4.3 Control fitosanitario de plantas silvestres de tara	Hectárea	358.16	268.46	74.96	Actividad importante para reducir la incidencia de las plagas y enfermedades
	1.4.4 Manejo de nuevas plantaciones de tara en macizo (1° año manejo)	Hectárea	231.12	231.12	100.00	106.40 ha en el 1° año y 124.72 ha en el 2° año.
	1.4.5 Manejo de nuevas plantaciones de tara en agroforestería (1° año manejo)	Hectárea	85.83	81.42	94.86	30.81 ha en el 2° año y 50.61 ha en el 3° año
Actividad 1.5	1.5.1 Manejo de parcelas demostrativas de plantaciones de tara	Hectárea	22	22	100.00	Se observó prácticas de poda de formación, abonamiento y sanidad
	1.5.2 Manejo de nuevas plantaciones de tara en macizo (2do año manejo)	Hectárea	125.12	125.12	100.00	Manejo de la poda, remoción y abonamiento, riego y control fitosanitario.
	1.5.3 Manejo de nuevas plantaciones de tara en agroforestería (2do año manejo)	Hectárea	50.11	41.61	83.04	Manejo de la poda, remoción y abonamiento, riego y control fitosanitario.
Componente 2 Productores de tara capacitados establecen nuevas plantaciones de tara en macizos y agroforestería						
Actividad 2.1	2.1.1 Asistencia técnica y seguimiento en viveros y plantaciones de tara	Asistencia técnica	4,732	5,913	100.00	Meta reprogramada de 5760 a 4,732
Actividad 2.2	2.2.1 Capacitación a productores en instalación de viveros, producción y establecimiento de plantaciones de tara	Curso	29	30	100.00	Meta reprogramada de 20 a 29
	2.2.2 Elaboración de manual de instalación de viveros,	Manual	1	1	100.00	Se verificó la existencia del manual

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº H. Meza

GERENCIA DE PROYECTOS VºBº A. Fort

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES

2.1. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO

Fuente	S/	%
FONDOEMPLEO	1´673,656.23	55.31
Cáritas Huari	29,500.00	0.98
Beneficiarios	1´322,527.10	43.71
Total	3´025,683.33	100.00

2.1.1. APORTE FONDOEMPLEO

Concepto	S/.
FONDOEMPLEO	1´673,656.23
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	58,724.77
Total	1´614,931.46

2.2. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

Componente	Último presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	% de ejecución	Observaciones
Componente 1	181,169.19	181,039.76	99.93	
Componente 2	259,482.08	258,973.33	99.80	
Componente 3	97,672.39	92,455.64	94.05	
Componente 6	1'076,607.80	1'027,460.57	95.43	
Total	**1'614,931.46**	**1´559,929.30**	**96.59**	

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº A. Martinez

2.3. CONTRAPARTIDA

Fuente	Último presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	% de ejecución con relación al presupuesto aprobado	Observaciones
Cáritas Huari	29,500.00	29,500.00	100.00	2 motocicletas y capacitación a promotores
Beneficiarios	1´322,527.10	1´419,872.30	107.36	Mano de obra e insumos (postes, abonos) valorizados
Total	**1´352,027.10**	**1´449,372.20**	**102.08**	

PROYECTOS PRODUCTIVOS VºBº H. Meza

2.4. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

Concepto	S/
A. Total a transferir	1´614,931.46
B. Desembolsos	1,581,464.85
C. Monto Ejecutado	1,559,929.30
D. Gastos Observados	0.00
Saldo (B-C+D)	**21,535.55**

GERENCIA DE PROYECTOS VºBº A. Fort

2.5 DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

El 05 de mayo de 2015, la institución ejecutora realizó la devolución de S/. 21,535.55 Nuevos Soles e informó a FONDOEMPLEO mediante la carta C-0041-15 que se adjunta como anexo al presente informe.

3. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

3.1. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

Nº	Nombre del supervisor	Institución	N° de monitoreo / entregable	Periodo	Calificación
1	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Monitoreo 1	Abr 12-Feb 13	Aprobado con reserva
2	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 1	Mar – Ago 13	Aprobado
3	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 2	Sep – Dic 13	Aprobado con reserva
4	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 3	Ene – Jun 14	Aprobado
5	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 4	Jul – Oct 14	Aprobado
6	Alfredo Gaviria	FONDOEMPLEO	Entregable 5	Nov 14 – Feb 15	Aprobado

3.2. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Con una inversión total de **S/. 3'004,147.78**, el proyecto ejecutó el 96.13% de las actividades que le permitió obtener el 79.11% de los productos programados y ventas por un monto ascendente a **S/. 1'452,111.00**.

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		% Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	FONDOEMPLEO %	Contrapartidas %
96.13	79.11	96.59	102.08

Los principales logros del componente 1 se refieren al manejo integral (limpieza, abonamiento, riego, poda, raleo y control fitosanitario) de 31,076 plantas de tara silvestre (124.30 ha) que se han puesto en valor, así como de 306.92 ha de nuevas plantaciones en macizo y 81.42 ha de nuevas plantaciones agroforestales.

En relación al componente 2, en base a tres campañas de producción de plantones en viveros, se logró sembrar un total de 226,618 plantones de tara, estableciéndose 306.92 ha de plantaciones en macizo y 53.66 ha de plantaciones agroforestales.

En el componente 3 los logros fueron menores. A pesar de ello, se logró incrementar la producción y comercialización de 136,046 kg en el año 0 a 303,019 kg en el año 3.

3.3. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La evaluación de la sostenibilidad se desarrolla desde tres dimensiones: ecológica, social y económica.

Desde el punto de vista **ecológico**, el paquete tecnológico promovido por el proyecto ha funcionado y será sostenible en la medida en que genere utilidades a los productores, los cuales han aprendido y aplican las técnicas de manejo de las plantas silvestres de tara. La producción de tara en plantaciones agroforestales se percibe como más sostenible que la producción en plantaciones en macizo por cuanto su mantenimiento está asegurado al hacerse en forma paralela al cultivo agrícola que acompaña a la tara. Más de 50,000 plantas silvestres de tara han mejorado su producción, de las cuales 31,076 han recibido el paquete tecnológico completo, esperándose que en los próximos años esta producción continúe aumentando. Se han instalado 226,618 plantones de tara, es decir, que en los próximos años la producción podrá multiplicar más de 7 veces, lo cual significa un importante aumento en el potencial productivo.

En relación al **bienestar social**, la sostenibilidad está en relación con el grado de satisfacción de los productores en relación a las utilidades que les genere el negocio de la venta de tara.

La **sostenibilidad económica** parece ser la clave del éxito y la que soporta o da base para que se alcance la sostenibilidad social y ecológica. Está en función del volumen, calidad y costos de producción y comercialización, así como de los precios de venta negociados. En este sentido, el proyecto no ha logrado mejorar sustantivamente el nivel de organización de los productores para negociar mejores precios y comercializar en forma conjunta. Los productores han sido conscientes durante todas las supervisiones realizadas, que la mayor debilidad se encuentra en su falta de organización; sin embargo, no han podido superarla y no se avizora en el corto plazo un cambio importante.

La principal recomendación para alcanzar la sostenibilidad se refiere al fortalecimiento de la organización de los productores de la cuenca de Yanamayo para poder ofertar volúmenes mayores, de tal manera de conseguir mejores condiciones de venta y mayores precios.

3.4. TRANSFERENCIA DE BIENES

Todos los bienes adquiridos han sido entregados con actas a los beneficiarios, a excepción de las motocicletas y los equipos de cómputo adquiridos. La IE solicitó a FONDOEMPLEO la transferencia de esos bienes para poder hacer seguimiento y monitoreo a los productores, misma que ha sido aceptada por el Área de Gestión de Proyectos de FONDOEMPLEO mediante carta N° 129/PP-GP-FE-2015.

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° A. Martinez

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

GERENCIA DE PROYECTOS V°B° A. Fort

CARITAS HUARI

Jr. Ancash 920
Huari – Ancash
Telefax. 043 – 453067

Av. Alejandro Tirado Nº 158
Urb. Santa Beatriz - Lima 1
Telf. 01-4710515

"Contribuye a la promoción humana y el desarrollo integral de los pueblos del Callejón de Conchucos"

C-0041-15

Ed. 2207 - 2015

Huari, 18 de Mayo del 2015

Señores:

FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO
Av. República de Panamá Nº 3030 piso 12-B, Urb. Córpac
San Isidro-Lima

FONDOEMPLEO
20 MAY 2015
RECIBIDO
Hora 03:5

ASUNTO : C-11-01-CARITAS HUARI-Ancash/Cancelado de Cuenta y Transferencia de Fondos.

REFERENCIA : Proyecto "Incremento del Ingreso y el Empleo Mediante el Cultivo de la Tara en la Microcuenca de Yanamayo"- Ancash.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto de la referencia cuyo plazo de ejecución fue a Marzo de 2015, adjunto a la presente copia de la Carta C-0038-15 de cancelación de la cuenta corriente del proyecto y transferencia del saldo a la CCI Nº 011-661-0001000024408-65 con denominación FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y DE PROMOCION DEL EMPLEO, por la suma de S/. 21,535.55.

Asimismo adjuntamos al presente el Estado de Cuenta del 01-30/04/15 de la cuenta corriente del proyecto Nº 375-1982654-0-84 con denominación CARITAS HUARI-FONDOEMPLEO-TARA II en el Banco de Crédito.

Agradeciendo su atención, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

CARITAS HUARI · SECRETARIO EJECUTIVO ·

PABLO QUIÑONES ASENCIOS
Secretario Ejecutivo de
Cáritas Huari

E_MAIL: chuari@caritas.org.pe

CARITAS HUARI

Jr. Ancash 920
Huari – Ancash
Telefax. 043 – 453067

Av. Alejandro Tirado Nº 158
Urb. Santa Beatriz - Lima 1
Telf. 01-4710515

"Contribuye a la promoción humana y el desarrollo integral de los pueblos del Callejón de Conchucos"

RUC: 20184663920

C-0038-15

Huari, 05 de Mayo del 2015

Señores:

BANCO DE CREDITO DEL PERU
Esquina Jr. Ricardo Navarrete y Jr. Juan de Aroma
Sucursal San Isidro
San Isidro

6718 15 MAY 13 -9:13

ATENCION: **KARINA AREVALO**
Ejecutivo de Negocios, Sectorista de la Cuenta

ASUNTO: **Solicita Cancelación de Cuenta**

Muy estimados Señores:

Mediante la presente estamos ordenando la cancelación de nuestra cuenta corriente en moneda nacional:

NOMBRE DE LA CUENTA	Nº DE CUENTA CORRIENTE
CARITAS HUARI-FONDOEMPLEO-TARA II	375-1982654-0-84

Los saldos a cargar o abonar que resulten de la operación le solicitamos transferir a la Cuenta Corriente Nº 193-0673574-0-76 con denominación CARITAS DE HUARI, en el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU.

Agradeciéndole por la atención que dé al presente nos despedimos reiterándole nuestros saludos cordiales y muestras de estima personal.

Atentamente,

P. WALTER FLORES LARA
D.N.I. Nº 33242367
Titular

CARITAS HUARI
SECRETARIO EJECUTIVO

P. QUIÑONES ASENCIOS
DNI Nº 10296538
Titular

BCP

Transferencias a bancos locales

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales
Número de operación: 52138913

Datos de la cuenta de origen

Nombre del Cliente: CARITAS HUARI-FONDOEMPLEO-TARA II - RUC 20184663920
Cuenta: 375-1982654-0-84 - CARITAS HUARI-FONDOEMPLEO-TARA II
Tipo: Corriente
Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: CONTINENTAL
Importe: S/. 21,535.55
CCI: 011-661-000100024408-65
Beneficiario: FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y DE PROMOCION DEL EMPLEO
ITF: Afecta
Documento: RUC 20419022722
Referencia: SALDO DE PROYECTO C-11-01/CARITAS HUARI

Observaciones

Ninguna

CARITAS HUARI SECRETARIO EJECUTIVO

Pablo Quiñones Asencios
Secretario Ejecutivo
CARITAS HUARI

BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	375-1982654-0-84

CARITAS HUARI-FONDOEMPLEO-TARA II
AV.ALEJANDRO TIRADO. N.158 URB.SANTA BEA
HUARI-ANCASH TRIZ
HUARI-ANCASH
375 (CJPDO0)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMUENTE K. JUAN
OFICINA SUC SAN ISIDRO
TELEFONO 6123456 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
A PARTIR DEL 04/05/2015 LA COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUES SERA DE S/.14.00 O US$5.00

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/04/2015	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/04/2015	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
41,054 64	0.00	0.00	6,896.78	12,620.33	0.00	0.00	21,537.53	65,476.96
A +	B +	C -	D -	E +	F -	G =	H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
07-04		A 375 1836867 0	TLC		111-008	015625	13:11	TNP0B0	4401	690.00-	40,364.64
07-04		A 193 1438256 0	TLC		111-008	015624	13:11	TNP0J1	4401	1,351.10-	39,013.54
07-04		HABER TLC 000400	TLC		111-008	835810	13:11	TNP0A1	4401	10,549.73-	28,463.81
08-04		CHEQUE 00000222	VEN	SUC HUARAZ	375-000	687976	10:53	S30344	3001	315.00-	28,148.81
08-04		CHEQUE 00000221	VEN	SUC HUARAZ	375-000	683438	10:51	S30344	3001	4,381.78-	23,767.03
14-04		CHEQUE 00000220	VEN	AG.INDEPENDENCIA	375-001	149597	[illegible]:13	S33006	3001	1,800.00-	21,967.03
28-04		CHEQUE 00000225	VEN	SUC HUARAZ	375-000	215268	11:17	S32611	3001	400.00-	21,567.03
30-04		ENVIO.EST.CTA Y	INT		375-000	933459			4991	3.50-	21,563.53
30-04		COM.MANTENIM Y	INT		-				0101	26.00-	21,537.53

BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	375-1982654-0-84

CARITAS HUARI-FONDOEMPLEO-TARA II
AV.ALEJANDRO TIRADO. N.158 URB.SANTA BEA
HUARI-ANCASH TRIZ
HUARI-ANCASH
375 (CJPDO0)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMUENTE K. JUAN
OFICINA SUC SAN ISIDRO
TELEFONO 6123456 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00000220	1,800.00	00000221	4,381.78	00000222	315.00	00000225	400.00

Carta Nº 129/PP-GP-FE-2015

DS - 563 - 201

FONDOEMPLEO

Lima, 24 de marzo de 2015

Señor
Pablo Quiñones Asencios
Secretario Ejecutivo
Cáritas Huari
Presente.-

Asunto: Proyecto C-11-01/Transferencia de bienes
Referencia: C-0022-15

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la carta de la referencia con la que solicitan la aprobación de la transferencia de los bienes adquiridos con el Proyecto C-11-01 "Incremento del ingreso y el empleo mediante el cultivo de la tara en la microcuenca de Yanamayo", como parte del equipamiento del mismo y para fines de capacitación y asistencia técnica.

Al respecto, le informo que, el Área de Proyectos productivos no presenta objeción a la transferencia de bienes para su representada y de acuerdo al siguiente cuadro de bienes:

Nro.	Activo	Cantidad
1	Equipo de cómputo compatible (CPU, procesador INTEL core i7 3820, memoria 4GB/1600 DOR3, monitor SANSUNY LED 21.5 S22B200N, teclado y mause KIT genius KB 110)	1
2	Impresora HP Laserjet 3015DN#BRBFD1MW3Z	1
3	Lap top Toshiba satellite, P755-SP5202L #1C021546K	
4	Proyector multimedia VIEWSONIC, pjd7383 3000 #RZQ114901008	1
5	Escaner BROTHER-ADS2000 NS: V63287L26165410	1
6	Motocicleta Honda CTX 200, placa C4-3167, serie 9C2MD35U0CR200218. Color rojo	1
7	Motocicleta Honda CTX 200, placa C4-2916, serie 9C2MD35U0CR200220. Color rojo	1

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida

Sin otro particular.

Atentamente,

PROYECTOS PP V°B° A. Martinez

Aldo E. Martínez Alca
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Meza

Herless A. Meza Coronado
Responsable Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO
