DS - 1623 - 2017

FONDOEMPLEO

CARTA Nº 682-GP-FE-2017

Lima, 13 de setiembre del 2017

Señor
JAVIER BENDEZU JIMENEZ
Representante de Perú y Bolivia
FUNDACIÓN CODESPA
Presente.-

Asunto : C-14-25 / Remisión del informe de cierre.

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gerente de Proyectos FONDOEMPLEO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, asimismo, remitirle el Informe de cierre del proyecto C-14-25 "Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento vinculado al turismo sostenible en Puno".

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (a) FONDOEMPLEO

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Walter Manuel Alcantara Villalobos
Gerente de Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

WAV/aema
Adj. Informe de cierre del proyecto C-14-25

INFORME CIERRE

FONDOEMPLEO

PROYECTO:
"Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento vinculado al turismo sostenible en Puno"

CÓDIGO: C-14-25

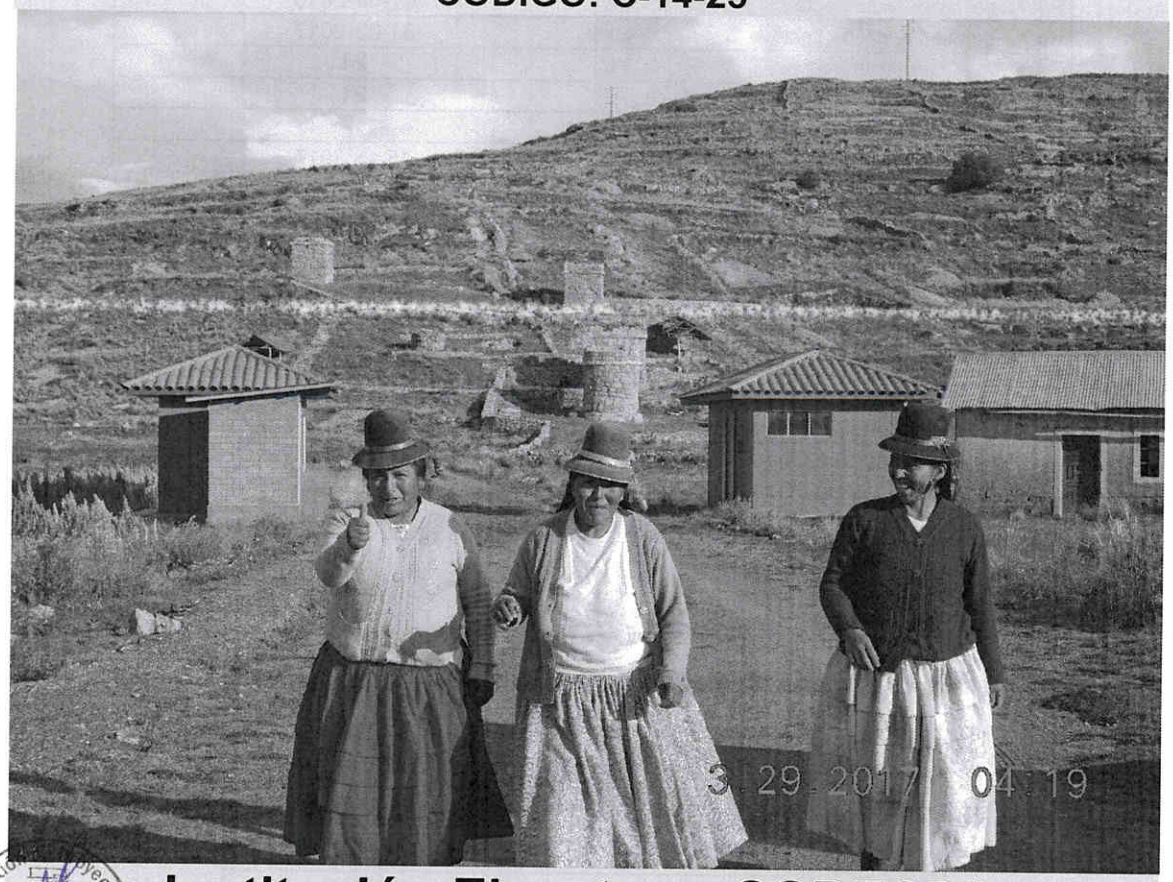

Institución Ejecutora: CODESPA

Gestor de Proyecto: Aldo Martínez Alca.

08 de setiembre, 2017

Gestión de Proyectos
V°B°
A. Martínez
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
M. Palacios
Responsable de Proyectos Productivos (e)
FONDOEMPLEO

1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Datos generales

Código de proyecto	C-14-25
Región del proyecto	Puno
Provincia	Puno,Acora,Chucuito
Distrito	Puno, Acora y Chucuito
Institución ejecutora	CODESPA
Institución asociadas	
Institución colaboradora	Municipalidad de Acora Municipalidad de Chucuito Municipalidad de Puno
Propósito (objetivo central)	Generar y fortalecer iniciativas económicas sostenibles vinculadas al sector turismo, mediante el desarrollo de capacidades emprendedoras en hombres y mujeres preferentemente entre 22 y 29 años, con ideas de negocio o negocio propio en marcha.
Población objetivo	500
Nombre del jefe del proyecto	Jorge Gálvez Canchari
Nombre del gestor del proyecto	Aldo Martínez Alca
Nombre del encargado de la supervisión	Aldo Martínez Alca
Fecha de inicio del proyecto	01-04-2015
Fecha de término del proyecto	31-03-2017
Duración del proyecto (meses)	24
Mes de ejecución	21
Número de entregables totales del proyecto	4
Fecha de presentación del informe final	15 abr 2017

b. Presupuesto del proyecto según convenio

Fuente de financiamiento	Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO	1'137,881.70
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	1`079,528.79
Institución Ejecutora	69,393.73
Municipalidad de Acora	5,910.00
Municipalidad de Chucuito	5,910.00
Municipalidad de Puno	5,910.00
Presupuesto total	1'166,652.52

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

2. SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución Técnicos	Propósito	91%
	Componentes	94%
	Productos	97%
	Actividades	99%

b. Resumen de ejecución presupuestal del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución presupuestaria	FONDOEMPLEO (Sin LB y EF)	96.77%
	Institución Ejecutora	100%
	Municipalidad de Acora	100%
	Municipalidad de Chucuito	100%
	Municipalidad de Puno	100%
	TOTAL	97.01%

c. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

Indicador de Propósito	Meta del proyecto	Meta alcanzada	% de logro
Número de capacitados	500	487	97%
Número de empleos generados	554	148	27%
Incremento de ingresos	S/ 111,705.22	S/ 181,359.40	100%

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Análisis del fin del proyecto

El fin del proyecto es: "Contribuir a la reducción de la pobreza en 3 distritos de la ciudad de Puno, a través de la generación de una cultura empresarial y el aprovechamiento de oportunidades de emprendimiento vinculadas al sector turismo".

334 beneficiarios del proyecto, implementaron y fortalecieron sus negocios logrando contribuir a la reducción de la pobreza en los tres distritos para tal fin se desarrollaron capacidades y habilidades para la instalación y fortalecimiento de negocios en el sector turismo.

b. Resultados de los indicadores de propósito

N°	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
Descripción del propósito: Generar y fortalecer iniciativas económicas sostenibles vinculadas al sector turismo, mediante el desarrollo de capacidades emprendedoras en hombres y mujeres preferentemente de entre 22 y 29 años, con ideas de negocio o negocio propio en marcha, en 3 distritos de la ciudad de Puno.						
1.1	369 H y M logran instalar y/o fortalecer sus negocios generando o incrementando sus ingresos en promedio en un 12% respecto al inicio del proyecto.	Hombre y mujeres	369	334	91%	Se ha logrado el 91% de la meta programada dado que 334 beneficiarios han implementado y fortalecido sus negocios generando el incremento de sus ingresos, generando nuevos puestos de trabajo y mejora de la calidad de vida.
Total					91%	

c. Resultados de los indicadores de los componentes

N°	Indicadores de componente	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Componente 1: Capacitación a hombres y mujeres de escasos recursos en gestión de negocios, habilidades y actitudes emprendedoras vinculadas al sector turismo, con especial participación de las mujeres, en los distritos de Puno, Chucuito, Acora.					
1.1	Tras la finalización del proyecto, al menos 450 hombres y mujeres, han mejorado sus conocimientos en gestión de negocios y habilidades y capacidades emprendedoras según la metodología CEFE	Beneficiarios capacitados	450	450	100%	Los beneficiarios manifestaron y demostraron que los talleres y las asesorías brindadas les permitieron mejorar en el aspecto personal y en sus negocios.
1.2	En el primer trimestre, se realizan 3 diagnósticos de potenciales turísticos distritales para el desarrollo de emprendimientos.	Diagnósticos	3	3	100%	Codespa realizó un estudio de mercado para Ácora, Chucuito y Puno.
1.3	Al finalizar el proyecto, al menos el 60% de los capacitados por el proyecto fueron mujeres.	Mujeres	270	260	96%	La participación de las mujeres demuestra el deseo de superación y búsqueda de independencia económica.
II	Componente 2: Implementación y mejora de emprendimientos a través de recursos propios y/o capital semilla, generando oportunidades de sostenibilidad para sus negocios a través del acceso a crédito y nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), en los distritos de Puno, Chuquito, Acora.					
2.1	Tras la finalización del proyecto, al menos 369 hombres y mujeres, generan y fortalecen iniciativas económicas sostenibles, en actividades vinculadas al sector turismo, a través de capital semilla y/o recursos propios	Beneficiarios con planes negocios o mejoras implementados	369	334	91%	Según Codespa no se logró la meta debido a que no cuentan con los recursos económicos, por factor tiempo, se encuentran laborando o por motivos académicos.
2.2	Tras la finalización del proyecto al menos 100 hombres y mujeres, participan e impulsan Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) para la generación de ingresos y la implementación de sus planes de negocio o mejora	Beneficiarios con planes negocios o mejoras implementados a través de UNICA	100	114	100%	Las ÚNICAS son una fuente de financiamiento gestionado entre los propios beneficiarios que les ha permitido agenciar financieramente a 114 beneficiarios para la inversión en su negocio.
2.3	Durante la ejecución del proyecto, al menos el 60% de los planes de negocio implementados, son liderados por mujeres.	Beneficiarios con planes negocios o mejoras implementados por mujeres	270	203	75%	Codespa reporta que 203 planes de negocios están siendo liderados por mujeres.
	Total				**94%**	

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

d. Resultados de los indicadores de productos

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Componente 1: Capacitación a hombres y mujeres de escasos recursos en gestión de negocios, habilidades y actitudes emprendedoras vinculadas al sector turismo, con especial participación de las mujeres, en los distritos de Puno, Chuquito, Acora.					
1.1	Hombres y Mujeres preferentemente de entre 22 y 29 años con ideas de negocio o negocios propios en marcha, son seleccionados para ser capacitados en gestión de negocios, habilidades y actitudes emprendedoras					
1.1.1	Un máximo de 250 de los hombres y mujeres emprendedores seleccionados, durante el primer año del proyecto para la capacitación, tienen ideas de negocio propio.	hombres/ mujeres	250	307	100%	El proceso de promoción y difusión se realizó con el apoyo de los gobiernos locales, facilitando que los emprendedores puedan participar de los servicios del proyecto.
1.1.2	Un mínimo de 250 de los hombres y mujeres emprendedores seleccionados durante el primer año del proyecto para la capacitación, cuentan con un negocio propio en marcha, con una antigüedad no mayor a 2 años.	hombres/ mujeres	250	246	98%	
1.2	Hombres y mujeres capacitados en gestión de negocios, habilidades y actitudes emprendedoras, cuentan con planes de negocio o planes de mejora para generar y o mejorar iniciativas económicas vinculadas al sector turismo					
1.2.1	En el primer año del proyecto, al menos 450 hombres y mujeres seleccionados, culminan satisfactoriamente la capacitación en gestión de negocios habilidades, actitudes emprendedoras; y, elaboración de planes de negocio y/o planes de mejora.	hombres/ mujeres	450	487	100%	Las capacitaciones fueron bien valoradas por los beneficiarios del proyecto porque les permitió mejorar su desempeño personal, laboral y educativo.
1.2.2	Durante la ejecución del proyecto, un máximo de 225 de los hombres y mujeres capacitados, con ideas de negocio, aprueban el plan de negocios propuesto	hombres/ mujeres	225	264	100%	Los beneficiarios presentaron sus planes de negocios en el concurso del capital semilla.
1.2.3	Durante la ejecución del proyecto, al menos 225 de los hombres y mujeres capacitados, con negocios propios en marcha, aprueban el plan de mejora propuesto	hombres/ mujeres	225	204	91%	
II	Componente 2: Implementación y mejora de emprendimientos a través de recursos propios y/o capital semilla, generando oportunidades de sostenibilidad para sus negocios a través del acceso a crédito y nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), en los distritos de Puno, Chuquito, Acora.					
2.1	Hombres y mujeres con planes de negocio o planes de mejora aprobados, acceden a capital semilla para cofinanciar la implementación de su plan de negocio o de mejora					
2.1.1	Al menos el 90% de los hombres y mujeres que cuentan con planes de negocio o mejora aprobados participan en el concurso del Capital Semilla para la cofinanciación de sus emprendimientos, durante la ejecución del proyecto.	hombres/ mujeres	405	402	99%	Algunos beneficiarios no se presentaron al concurso debido a tiempo, temor a exponer o por cruce de actividades.
2.1.2	Al menos 20 premios de Capital Semilla son entregados a hombres y mujeres emprendedores con ideas de negocio para cofinanciar la implementación de su plan de negocio, durante la ejecución del proyecto (en el primer año 10, en el segundo 10).	Premios Capital Semilla	20	20	100%	Este aporte de capital semilla les ha permitido implementar su negocio.

Gestión de Proyectos V°B° A. Martínez Responsable de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (E) FONDOEMPLEO

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
2.1.3	Al menos 20 premios de Capital Semilla son entregados a hombres y mujeres emprendedores con negocios en marcha para cofinanciar la implementación de su plan de mejora de negocio, durante la ejecución del proyecto (en el primer año 10, en el segundo 10).	Premios Capital Semilla	20	20	100%	El aporte del capital semilla les permitió consolidar su negocio en marcha.
2.2	Hombres y mujeres emprendedores implementan su plan de negocio o plan de mejora, financiado con capital semilla recibido por el proyecto y recursos propios, a través de la generación de oportunidades de acceso al crédito y al usu de nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs)					
2.2.1	Al finalizar el proyecto, los 40 hombres y mujeres que reciben Capital Semilla, son asesorados y dotados de herramientas para garantizar el acceso a crédito, TICs, Marketing y Ventas; y, aspectos tributarios y legales	hombres/ mujeres	40	40	100%	Los temas transversales son: acceso al crédito, ÚNICAS, legislación tributaria y legal, marketing.
2.2.2	Durante la ejecución del proyecto, los 40 hombres y mujeres que reciben Capital Semilla consiguen reunir, al menos el 30% del monto necesario para la implementación de sus planes de negocio o mejora.	hombres/ mujeres	40	40	100%	El 30% conseguido fue producto de sus ahorros, prestamos de familiares o créditos.
2.2.3	En el último año del proyecto, los 40 hombres y mujeres que reciben Capital Semilla logran implementar sus planes de negocio o mejora	Planes de negocio implementados	40	37	92%	Durante la última visita (29/03/2017) se comprobó que tres beneficiarios se encontraban en proceso de implementación de su negocio.
2.3	Hombres y mujeres emprendedores implementan su plan de negocio o plan de mejora, financiado con recursos propios, a través de la generación de oportunidades de acceso al crédito y al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs)					
2.3.1	Al menos, 410 hombres y mujeres que cuentan con un plan de negocios o de mejora aprobado y no han recibido capital semilla, son capacitados y dotados de herramientas para garantizar el acceso a crédito, TICs, Marketing y Ventas; y, aspectos tributarios y legales	hombres/ mujeres	410	396	96%	Según el cuadro de beneficiarios se tiene 396 beneficiarios capacitados y activos al concluir el proyecto.
2.3.2	Al menos 329 hombres y mujeres con planes de negocio o mejora aprobados, que no han recibido capital semilla, consiguen recursos propios (familiares, crédito) para la implementación de sus planes de negocio, durante el segundo año del proyecto.	hombres/ mujeres	329	294	89%	Para implementar sus negocios, los beneficiarios del proyecto utilizaron sus ahorros o consiguieron prestamos de familiares y de las UNICAS
2.3.3	En el último año del proyecto, al menos 329 hombres y mujeres con planes de negocio o mejora aprobados, que no han recibido capital semilla, logran implementar sus planes de negocio o mejora.	Planes de negocio implementados	329	294	89%	
Total					97%	

Gestión de Proyectos
V°B°
A. Martínez
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
M. Palacios
Responsable de Proyectos Productivos (e)
FONDOEMPLEO

4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fuente de financiamiento	Presupuesto según convenio S/.	Total según presupuesto vigente S/.	Presupuesto		% de ejecución	Comentarios
			Programado S/.	Ejecutado S/.		
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	1'079,528.79	1'079,528.79	1'079,528.79	1'044,607.73	96.77%	
Institución Ejecutora	69,393.73	69,263.53	69,263.53	69,263.53	100%	
Municipio de Acora	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	100%	
Municipio de Chucuito	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	100%	
Municipio de Puno	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	100%	
TOTAL	1`166,652.52	1'166,522.32	1'166,522.32	1'124,814.33	97.01%	

Concepto	S/.
A. Total a transferir	1'079,528.79
B. Desembolsos	1'042,566.64
C. Monto Ejecutado	1'044,607.73
D. Descuentos y/o Penalidades	
E. Gastos Observados	
Saldo (B-C-D-E)	-2,041.09

4.1 DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

La institución ejecutora realizó la devolución de S/ 36.71 Soles el 12 de abril del 2017, mediante la carta Nº 018-2017/CODESPA-PUN que se adjunta como anexo al presente informe; en este reporte no consideraron los pagos pendientes que se ejecutaron en el mes de abril, por lo que se debe devolver a CODESPA el monto ascendente a S/ 2,041.09 Soles.

5. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

5.1 CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N°	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACIÓN
1	Gilber Joel Calderón Mamani	Supervisor Externo	01	Abr 15 - Oct 15	Aprobado
2	Elva Luz Moya Campos	Gestor de Proyectos	02	Nov 17 - Mar 16	Aprobado
3	Aldo Martínez Alca	Gestor de Proyectos	03	Mar 16 - set 16	Aprobado
4	Aldo Martínez Alca	Gestor de Proyectos	04	Oct 16 - Mar 17	Aprobado

5.2 CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO (narrativo)

- ✓ Con una inversión total de S/1'124,814.33, el Proyecto implementó el 99% de las actividades que le permitió obtener el 97%, 94 y 91 de los indicadores de producto, componente y propósito programado en el proyecto.
- ✓ Como resultado del proyecto, se generó 148 empleos que representa el 27% de lo planteado e ingresos por S/ 181,359 Soles logrando el 100% de lo planteado.

5.3 LECCIONES APRENDIDAS

- ✓ El trabajo coordinado con los tres gobiernos locales (Acora, Chucuito y Puno) permitió un mayor impacto y sostenibilidad en la ejecución del proyecto, los Municipios apoyaron en la ejecución de algunas actividades facilitando ambientes y equipos para los talleres de capacitación, y difusión del proyecto.
- ✓ Para evitar la deserción de los beneficiarios, las capacitaciones deben implementarse de inmediato, luego de la inscripción de los beneficiarios.

5.4 APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- ✓ Según Codespa, los tres gobiernos locales han asumido la responsabilidad de continuar con el proyecto con la finalidad de brindarles soporte a los beneficiarios como una oportunidad de generar autoempleo y empleo para terceros.
- ✓ Los beneficiarios a través de la conformación de las ÚNICAS han logrado generar fondos que permiten solventar necesidades y aprovechar oportunidades que puedan presentarse en el proceso del desarrollo del negocio.

5.5 TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

Durante la ejecución del proyecto se adquirieron diversos bienes para el desarrollo de las actividades programadas por el proyecto, los cuales fueron transferidos a Fundación Codespa.

A continuación se detalla la lista de bienes transferidos a Fundación Codespa según señala la institución ejecutora en la carta Nº 018-2017/CODESPA-PUN y mediante las actas de entrega adjuntas.

Equipo/herramienta	Cantidad
Impresora Láser Hp	1
Computadora de escritorio	1
Estabilizador	1
Proyector multimedia Viewsonic	1
Computadora personal Lenovo	1
Disco Duro externo Seagate	1
Cámara fotográfica Canon	1

6. LOGROS

- ✓ 468 hombres y mujeres beneficiarios del proyecto lograron elaborar su plan de negocios e identificaron sus características emprendedoras personales.
- ✓ 37 beneficiarios que recibieron capital semilla, lograron implementar sus planes de negocio o planes de mejora.
- ✓ 294 beneficiarios que no recibieron capital semilla lograron implementar sus planes de negocio o planes de mejora.

7. RESULTADOS NO PREVISTOS

- ✓ Desarrollo de asistencias técnicas en temas especializados como: lácteos, gastronomía, tejido en lana y crianza de cuyes con la finalidad de dar mayor soporte en temas técnicos especializados con la actividad económica que vienen implementando. Ello ha permitido que puedan aplicar nuevas técnicas productivas que le generen mayor eficiencia en sus actividades diarias.
- ✓ El tema asociativo se ha dado a nivel de comunidades donde el capital semilla ha sido compartido con la finalidad de lograr un mayor afianzamiento de sus integrantes y lograr un mayor impacto a nivel de gestión del negocio como es el caso de los beneficiarios de Culta ubicada en la ciudad de Ácora quienes se dedican a la actividad ganadera. Las capacitaciones del proyecto han sido beneficiosos pues les permitió tener una gestión más integral a los beneficiarios.

Gestión de Proyectos VºBº M. Palacios Responsable de Proyectos Productivos (e) FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº A. Martinez Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Aldo Enrique Martínez Alca
Gestor de Proyectos

DI - 1666 - 2017

OFICINA PUNO
Jr. Arequipa Nº 731 Interior 5 -3er Piso
Puno, Puno-Perú
Teléfono: +51 051 205411

fundación CODESPA
Conviértete en oportunidad
Presidente de Honor S.M. El Rey

Puno, 12 de Abril del 2017

CARTA Nº 018-2017/CODESPA-PUN
Señora:
TERESA VELASQUEZ BRACAMONTE
Directora Ejecutiva
FONDOEMPLEO

FONDOEMPLEO
17 ABR 2017
RECIBIDO
Esta acuse de recibo no es señal de conformidad

Presente.-

Asunto: Remito Anexo N 013 – Informe Final Proyecto C-14-25
Atención: Aldo Martínez – Gestor de proyectos FONDOEMPLEO

De mi mayor consideración;

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitirle adjunto el Anexo 013 INFORME FINAL del proyecto C-14-25 **"Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento vinculado al turismo sostenible en Puno"**, para lo cual se adjunta los informes en archivo digital, los cuales son:

- Detalle de Gastos Ejecutados por Partidas Presupuestales
- Estados de cuenta bancarios
- Libro Bancos
- Sustento de gastos de FE
- Sustento de aporte de Contrapartida
- Reporte de Avance (L3)_C-14-25 Marzo – Anexos 01,02,03,04,05,10,11,14)
- Cuadro de beneficiarios consolidados
- Informe FONDOEMPLEO Marzo
- Transferencia de bienes adquiridos por el proyecto (Actas y cuadro resumen).
- Carta de aprobación de transferencia de bienes.
- Carta de cierre de cuenta.
- Constancias de transferencia de devolución de fondos.

La documentación señalada será remitida a través del enlace Dropbox, por contener archivos muy pesados que no pueden ser enviados vía e-mail.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente

JAVIER BENDEZU JIMENEZ
Representante en Perú y Bolivia

30años
1985-2015

fundación CODESPA
Conviértete en oportunidad
Presidente de Honor S.M. El Rey

Lima, 12 de abril de 2017

CARTA Nº 033-2017/CODESPA-PER

Señores
BBVA CONTINENTAL

Atención: Liliana Sánchez Montero (Ejecutiva de Negocios - Banca Institucional)

Estimados señores:

Por medio de la presente, agradeceremos realizar las siguientes órdenes:

1. Cierre a la fecha de la cuenta que se detallan:

Nº DE CUENTA			DENOMINACIÓN	TIPO
0011	661	01-00061656	NS_FE_PUNO SOLES	Ahorros

Los adeudados por concepto de mantenimiento y portes correspondientes a la cuenta a cerrar serán cargados a la siguiente cuenta: 0011-0661-02-00054657.

Sin otro particular,

Atentamente.

H. Javier Bendezú Jiménez
Representante en Perú y Bolivia
FUNDACIÓN CODESPA

Denis Dioses Dueñas
Administrador para Perú
FUNDACIÓN CODESPA

Fundación CODESPA (Perú)
C/. José del Llano Zapata 331, Dpto. 801
Miraflores, Lima – Perú
Teléfono +51 1 2213605

Fundación CODESPA (España)
C/. Rafael Bergamín 12, bajo, 28043
Madrid – España
Teléfono +34 91 7444240

BBVA Continental

FUNDACION CODESPA

2017/04/12 17:23:32

Autorización de Operaciones

SU OPERACION HA SIDO REALIZADA

Número Operación	10,223-100
Operación	Pago de Instituciones - FONDOEMPLEO-DEVOLUCION PROYECT
Usuario(s) que autoriza(n)	HECTOR JAVIER BENDEZU JIMENEZ / DIOSES DUE¿AS DENIS FELIMER
Número de Cuenta de Cargo	0011-0661-0100061656
Importe a Cargar	36.71 SOLES
Importe Cargado	36.71 SOLES
Referencia	20304611937FUNDACION CODESPAc-14-25
Fecha / Hora de 1ra Firma	12/04/2017 - 14:23:55
Fecha de Proceso	12/04/2017

OFICINA PUNO
Jr. Arequipa N° 731 Interior 5 -3er Piso
Puno, Puno-Perú
Teléfono: +51 051 205411

fundación CODESPA
Conviértete en oportunidad
Presidente de Honor S.M. El Rey

CARTA N° 017-2017/CODESPA-PUN

Puno, 24 de Marzo de 2017

Señora:
TERESA VELASQUEZ BRACAMONTE
Directora Ejecutiva
FONDOEMPLEO

Presente.-

Asunto: Solicita Autorización para Transferencia de Bienes (Maquinas, Equipos, Muebles y Enseres).

Atención: Aldo Martínez – Gestor de proyectos FONDOEMPLEO

De mi mayor consideración;

Es grato dirigirme a usted, en atención al proyecto C-14-25 **"Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento vinculado al turismo sostenible en Puno"**, mediante el presente queremos hacer de su conocimiento que de acuerdo al Manual de Gestión de Proyectos, en el Item 3.13 TRANFERENCIA DE BIENES con recursos donados por FONDOEMPLEO, indica que debemos realizar la Transferencia de Bienes a Título Gratuito, para ello solicitamos **AUTORIZACION** a fin de proceder con lo indicado en el Manual (de acuerdo a la relación adjunta).

Esperando su atención y respuesta, reiteramos nuestro cordial saludo.

Atentamente;

JAVIER BENDEZU JIMENEZ
Representante en Perú y Bolivia

CANTIDAD	UM	DENOMINACIÓN	MARCA	SERIE	MODELO/DETALLE	COLOR	FECHA DE ADQUISICIÓN	COMPROBANTE	PROVEEDOR	SOLES	RECEPTOR DE DONACION	JUSTIFICACION
1	Unidad	ESCRITORIO DE MELAMINA	N/A	N/A	120 X 65 CM	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	250.00	Comunidad de Culta - Acora	Beneficiarios emprendedores en Lácteos.
1	Unidad	ESCRITORIO DE MELAMINA	N/A	N/A	120 X 65 CM	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	250.00	Isla Los Uros Titino - Puno	Beneficiarios emprendedores en Artesania, Pesca y Turismo Rural.
1	Unidad	ESCRITORIO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	150 X 65 CM	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	370.00	Comunidad de Chimu - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania en Totora.
1	Unidad	ESTANTE DE MELAMINA	N/A	N/A	2.00X0.90	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	268.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	ARCHIVADOR C/GABETAS	N/A	N/A	4 GABETAS 1.30X0.50X0.45 M	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	450.00	Comunidad de Culta - Acora	Beneficiarios emprendedores en Lácteos.
1	Unidad	SILLA FIJA	N/A	N/A	CRISTINA	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	74.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	SILLA FIJA	N/A	N/A	CRISTINA	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	74.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	SILLA FIJA	N/A	N/A	CRISTINA	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	74.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	SILLA FIJA	N/A	N/A	CRISTINA	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	74.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	SILLA FIJA	N/A	N/A	CRISTINA	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	74.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	SILLA FIJA	N/A	N/A	CRISTINA	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	74.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	MESA DE REUNIONES	N/A	N/A	1.80X1.00 M	BIEN	25/05/2015	F/. 001-000071	SUCA RAMOS KARIN JUDITH	850.00	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	PIZARRA ACRÍLICA	N/A	N/A	1.80X1.20 M	BIEN	28/05/2015	F/. 001-029398	CORPORACIÓN DE VENTAS EIRL	127.12	Comunidad de Chimu - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania en Totora.
1	Unidad	PERFORADOR MEDIANO	LAYCONSA	N/A	METAL	BIEN	28/05/2015	F/. 0029400	CORPORACIÓN DE VENTAS E.I.R.L.	12.00	Isla Los Uros Titino - Puno	Beneficiarios emprendedores en Artesania, Pesca y Turismo Rural.
1	Unidad	ENGRAMPADOR MEDIANO	LAYCONSA	N/A	METAL	BIEN	28/05/2015	F/. 0029400	CORPORACIÓN DE VENTAS E.I.R.L.	12.00	Isla Los Uros Titino - Puno	Beneficiarios emprendedores en Artesania, Pesca y Turismo Rural.
1	Unidad	CALCULADORA	CASIO	MX-12OS	PLÁSTICO	BIEN	31/10/2015	F/. 002-000829	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PANAMERICANA MULTISERVICIOS	23.80	Isla Los Uros Titino - Puno	Beneficiarios emprendedores en Artesania, Pesca y Turismo Rural.
1	Unidad	PAPELERAS	REY	N/A	PLÁSTICO	BIEN	22/06/2015	FA80-00079736	PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	6.90	Comunidad de Culta - Acora	Beneficiarios emprendedores en Lácteos.
1	Unidad	PAPELERAS	REY	N/A	PLÁSTICO	BIEN	22/06/2015	FA80-00079736	PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	6.90	Comunidad de Chimu - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania en Totora.
1	Unidad	PAPELERAS	REY	N/A	PLÁSTICO	BIEN	22/06/2015	FA80-00079736	PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	6.90	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.
1	Unidad	CALCULADORA	CASIO	MX-12OS	PLÁSTICO	BIEN	31/10/2015	F/. 002-000829	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PANAMERICANA MULTISERVICIOS	23.80	Comunidad de Molloco - Acora	Beneficiarios emprendedores en Artesania.

REPRESENTANTE PERÚ BOLIVIA
CODESPA
V°B°
J. Benavente

CANTIDAD	UM	DENOMINACION	MARCA	SERIE	MODELO/DETALLE	COLOR	FECHA DE ADQUISICIÓN	COMPROBANTE	PROVEEDOR	SOLES	RECEPTOR DE DONACION	JUSTIFICACION
1	Unidad	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - LASER	HP	CNB8GB9F7P	LASERJET PRO M225DW	NEGRO	15/05/2015	F/. 001-002351	GRUPO COMPUTINTAS SAC	1,230.00	FUNDACION CODESPA	Logista de trabajo/ ejecución de proyecto
1	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (contiene):									FUNDACION CODESPA	Logista de trabajo/ ejecución de proyecto
		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS	3022C3310057	COREL I3	NEGRO	15/05/2015	F/. 001-000329	GRUPO PANDAS PERÚ SAC	1,170.00		
		MONITOR A COLOR	LG	502NDSK6C174	20"	NEGRO	15/05/2015	F/. 001-000329	GRUPO PANDAS PERÚ SAC	360.00		
		TECLADO MULTIMEDIA	MICRONICS	2937K7060178	MIC K708	NEGRO	15/05/2015	F/. 001-000329	GRUPO PANDAS PERÚ SAC	70.00		
		MOUSE ÓPTICO	MICRONICS	2945M6320817	MIC M 632	NEGRO	15/05/2015	F/. 001-000329	GRUPO PANDAS PERÚ SAC	30.00		
1	Unidad	ESTABILIZADOR	QUASAR	3011PLI12001973	PLI 1200	NEGRO	15/05/2015	F/. 001-000329	GRUPO PANDAS PERÚ SAC	50.00	FUNDACION CODESPA	Logista de trabajo/ ejecución de proyecto
1	Unidad	PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEWSONIC	U4P151701660	PJD5153 3200 SVGA 800 X 600	NEGRO	09/07/2015	F/.001-0002657	GRUPO COMPUTINTAS SAC	1,261.86	FUNDACION CODESPA	Logista de trabajo/ ejecución de proyecto
1	Unidad	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	CB35297441	B50-70	NEGRO	09/07/2015	F/. 001-017273	OPEN TECNOLOGIES SAC	1,586.44	FUNDACION CODESPA	Logista de trabajo/ ejecución de proyecto
1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE	S/N NA7LFT34	EXPANSION STE20004000 2TB USB 3.0	PLOMO	20/10/2015	F/.001-0003222	GRUPO COMPUTINTAS S.A.C	320.34	FUNDACION CODESPA	Logista de trabajo/ ejecución de proyecto
1	Unidad	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL + CARGADOR **(memoria chip se encuentra dañada)**	CANON	PC2197	CANON SHOT ELPH 160	NEGRO	17/07/2015	FB16-009119	IMPORTACIONES HIRAOKA SAC	295.76	FUNDACION CODESPA	Logista de trabajo/ ejecución de proyecto

REPRESENTANTE PERÚ BOLIVIA
CODESPA
V°B°
J. Bendezú

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES A TITULO GRATUITO

Siendo las 10:00 am del día Viernes 31 de Marzo del 2017, en la oficina de Fundación Codespa, se reunieron:

1. Héctor Javier Bendezú Jiménez, representante Perú - Bolivia de Fundación Codespa, identificado con DNI N° 09547922.
2. Norma Hermelinda Coyla Balcona, identificado con DNI 01327831, Vice Presidente de la Asociación Artesanías de Totora Lupaca Chimu", Comunidad de Chimu – Distrito de Puno.

Con la finalidad de suscribir la presente Acta de Transferencia de Bienes a Título Gratuito, se indica lo siguiente:

PRIMERO: Que, la Fundación CODESPA ha ejecutado el proyecto "Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento Vinculado al Turismo Sostenible en Puno", con el financiamiento del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO, en el marco del Convenio de Financiamiento de Proyectos, suscrito entre la Fundación CODESPA y FONDOEMPLEO, con una vigencia de 24 meses (del 01 de abril del 2015 al 31 de marzo del 2017).

SEGUNDO: Que los bienes de uso adquiridos para el manejo del proyecto mencionado en el punto 1 y que se detallan en anexo son transferidos a la ASOCIACION ARTESANIAS DE TOTORA LUPACA CHIMU", con el fin de ser utilizado en acciones orientadas a la sostenibilidad y toda acción relacionado al desarrollo de la actividad artesanal y turística en la Comunidad de Chimu.

Siendo las 10:30 am, se suscribe la presente en señal de conformidad, en dos ejemplares de idéntico tenor.

Héctor Javier Bendezú Jiménez
Representante Perú – Bolivia
Fundación Codespa

Norma Hermelinda Coyla Balcona
DNI N° 01327831
Vice Presidente

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

CUADRO DETALLADO DE BIENES A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO

PROYECTO: C-14-25 "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

Nº	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL BIEN ADQUIRIDO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO S/.	MONTO TOTAL S/.
01	ESCRITORIO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	FACTURA	001-000071	1	370.00	370.00
02	PIZARRA ACRÍLICA	FACTURA	001-029398	1	127.12	12.12
03	PAPELERAS	FACTURA	FA80-00079736	1	6.90	6.90
					TOTAL	**S/. 389.02**

REPRESENTANTE PERÚ BOLIVIA
CODESPA
V°B°
J. Bendezú

01327831

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES A TITULO GRATUITO

Siendo las 10:00 am del día Viernes 31 de Marzo del 2017, en la oficina de Fundación Codespa, se reunieron:

1. Héctor Javier Bendezú Jiménez, representante Perú - Bolivia de Fundación Codespa, identificado con DNI N° 09547922.

2. César Mamani Pacompia, identificado con DNI 42095876, Presidente de la Isla Los Uros – Sector Llachu Punco, – Distrito de Puno.

Con la finalidad de suscribir la presente Acta de Transferencia de Bienes a Título Gratuito, se indica lo siguiente:

PRIMERO: Que, la Fundación CODESPA ha ejecutado el proyecto "Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento Vinculado al Turismo Sostenible en Puno", con el financiamiento del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO, en el marco del Convenio de Financiamiento de Proyectos, suscrito entre la Fundación CODESPA y FONDOEMPLEO, con una vigencia de 24 meses (del 01 de abril del 2015 al 31 de marzo del 2017).

SEGUNDO: Que los bienes de uso adquiridos para el manejo del proyecto mencionado en el punto 1 y que se detallan en anexo son transferidos al ISLA LOS UROS – SECTOR LLACHU PUNCO, con el fin de ser utilizado en acciones orientadas a la sostenibilidad y toda acción relacionado al desarrollo de la actividad artesanal y turística en la Isla Los Uros.

Siendo las 10:30 am, se suscribe la presente en señal de conformidad, en dos ejemplares de idéntico tenor.

Héctor Javier Bendezú Jiménez
Representante Perú – Bolivia
Fundación Codespa

César Mamani Pacompia
DNI N° 42095876
Presidente

COMUNIDAD CAMPESINA UROS CHULLUNI SECTOR LLACHOPUNCO
PRESIDENTE
PUNO PERU

CESAR MAMANI PACOMPIA
DNI 42095876
PRESIDENTE

FONDOEMPLEO

PUNOEMPRENDE

fundación CODESPA

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

CUADRO DETALLADO DE BIENES A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO

PROYECTO: C-14-25 "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

Nº	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL BIEN ADQUIRIDO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO S/.	MONTO TOTAL S/.
01	ESCRITORIO DE MELAMINA	FACTURA	001-000071	1	250.00	250.00
02	PERFORADOR MEDIANO	FACTURA	0029400	1	12.00	12.00
03	ENGRAMPADOR MEDIANO	FACTURA	0029400	1	12.00	12.00
04	CALCULADORA	FACTURA	002-000829	1	23.80	23.80
05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: • MONITOR A COLOR, MARCA LG – FLATRON W1941S • TECLADO COLOR NEGRO, MARCA GENIUS-MODELO KU-0138 • MOUSE OPTICO, COLOR ROJA Y NEGRO, MARCA CYBERTEL CYCLONE • CPU COLOR NEGRO, MARCA INTEL CORE2 DUO (AL-EC-61/2011)	DONACION FUNDACION CODESPA				800.00
					TOTAL	**S/. 1,097.80**

COMUNIDAD CAMPESINA UNUS CHULLUNI SECTOR LLACHOPUNCO PRESIDENTE PUNO PERU

CESAR MAMANI PACOMPIA
DNI 42095876
PRESIDENTE

REPRESENTANTE PERÚ BOLIVIA CODESPA V°B° J. Bendezú

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES A TITULO GRATUITO

Siendo las 10:00 am del día Viernes 31 de Marzo del 2017, en la oficina de Fundación Codespa, se reunieron:

1. Héctor Javier Bendezú Jiménez, representante Perú - Bolivia de Fundación Codespa, identificado con DNI N° 09547922.
2. Yoisy Maribel Ramos Ccopa, identificado con DNI 44262510, Presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanal de Culta" – Centro Poblado de Culta - Distrito de Acora.

Con la finalidad de suscribir la presente Acta de Transferencia de Bienes a Título Gratuito, se indica lo siguiente:

PRIMERO: Que, la Fundación CODESPA ha ejecutado el proyecto "Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento Vinculado al Turismo Sostenible en Puno", con el financiamiento del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO, en el marco del Convenio de Financiamiento de Proyectos, suscrito entre la Fundación CODESPA y FONDOEMPLEO, con una vigencia de 24 meses (del 01 de abril del 2015 al 31 de marzo del 2017).

SEGUNDO: Que los bienes de uso adquiridos para el manejo del proyecto mencionado en el punto 1 y que se detallan en anexo son transferidos a la "ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANAL DE CULTA" - Distrito de Acora.", con el fin de ser utilizado en acciones orientadas a la sostenibilidad y toda acción relacionado al desarrollo de la actividad ganadera en el Centro Poblado de Culta.

Siendo las 10:30 am, se suscribe la presente en señal de conformidad, en dos ejemplares de idéntico tenor.

Héctor Javier Bendezú Jiménez
Representante Perú – Bolivia
Fundación Codespa

Yoisy Maribel Ramos Ccopa
DNI N° 44262510
Presidente

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

CUADRO DETALLADO DE BIENES A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO

PROYECTO: C-14-25 "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

Nº	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL BIEN ADQUIRIDO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO S/.	MONTO TOTAL S/.
01	ESCRITORIO DE MELAMINA	FACTURA	001-000071	01	250.00	250.00
02	ARCHIVADOR C/GABETAS	FACTURA	001-000071	01	450.00	450.00
03	PAPELERAS	FACTURA	FA80-00079736	01	6.90	6.90
					TOTAL	**S/. 706.90**

44262510

REPRESENTANTE PERÚ BOLIVIA
CODESPA
V°B°
J. Bendezú

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES A TITULO GRATUITO

Siendo las 10:00 am del día Viernes 31 de Marzo del 2017, en la oficina de Fundación Codespa, se reunieron:

1. Héctor Javier Bendezú Jiménez, representante Perú - Bolivia de Fundación Codespa, identificado con DNI N° 09547922.

2. Lourdes Ramos Flores, identificado con DNI 01299543, Presidenta de la Organización de Artesanas de Chullpa Aimara", Comunidad de Molloco – Distrito de Acora.

Con la finalidad de suscribir la presente Acta de Transferencia de Bienes a Título Gratuito, se indica lo siguiente:

PRIMERO: Que, la Fundación CODESPA ha ejecutado el proyecto "Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento Vinculado al Turismo Sostenible en Puno", con el financiamiento del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO, en el marco del Convenio de Financiamiento de Proyectos, suscrito entre la Fundación CODESPA y FONDOEMPLEO, con una vigencia de 24 meses (del 01 de abril del 2015 al 31 de marzo del 2017).

SEGUNDO: Que los bienes de uso adquiridos para el manejo del proyecto mencionado en el punto 1 y que se detallan en anexo son transferidos a la "ORGANIZACIÓN DE ARTESANAS DE CHULLPA AIMARA", con el fin de ser utilizado en acciones orientadas a la sostenibilidad y toda acción relacionado al desarrollo de la actividad artesanal y turística en la Comunidad de Molloco.

Siendo las 10:30 am, se suscribe la presente en señal de conformidad, en dos ejemplares de idéntico tenor.

Héctor Javier Bendezú Jiménez
Representante Perú – Bolivia
Fundación Codespa

Lourdes Ramos Flores
DNI N° 01299543
Presidente

PROYECTO "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

CUADRO DETALLADO DE BIENES A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO

PROYECTO: C-14-25 "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VINCULADO AL TURISMO SOSTENIBLE EN PUNO"

Nº	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL BIEN ADQUIRIDO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO S/.	MONTO TOTAL S/.
01	ESTANTE DE MELAMINA	FACTURA	001-000071	1	268.00	268.00
02	SILLA FIJA (Modelo Cristina)	FACTURA	001-000071	6	74.00	444.00
03	MESA DE REUNIONES	FACTURA	001-000071	1	850.00	850.00
04	PAPELERAS	FACTURA	FA80-00079736	1	6.90	6.90
05	CALCULADORA	FACTURA	002-000829	1	23.80	23.80
					TOTAL	**S/. 1,592.70**

Lourdes Ramos Flo

DNI: 01299543

REPRESENTANTE PERÚ BOLIVIA
CODESPA
V°B°
J. Bendezu
